«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» · WIN TO BE DONE · ASTANA IT UNIVERSITY

Не выбирать площадку и не подписывать оборудование сегодня

Утвердить стадию 0: 90 дней проверки, до 750 млн ₸ без необратимых контрактов, точка решения 2 февраля 2027 года

70 млрд ₸
лимит, не превышаем

−25–35%
захоронения: честная цель

5 критериев
перехода к стройке

02.02.2027
точка решения

02 · АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Мощность 400 тыс. т — это приём, а не переработка: реально 45–75 тыс. т фракций

1. Домохозяйство

360 тыс. т/год. Органика 38%, бумага 15%, пластик 14%, стекло 9%, металл 4%, прочее 20%

→

2. Контейнерная площадка

4 фракции + смешанные. QR, засорённость сейчас до 25%

→

3. Вывоз

Оператор, маршруты по фракциям, весы и GPS

→

4. Комплекс

Приёмка и контроль качества → сортировка → компостирование органики

Товарные фракции

45–75 тыс. т/год → переработчики по договорам

Компост / стабилизат

Из ~137 тыс. т органики (доля выхода — допущение, проверить)

Полигон

Остаток. Цель: −25–35% к захоронению 2026 года

Факты

70 млрд ₸ без доп. средств · 750 млн ₸ на 90 дней · оплачено 450 млн · 26 мес.

Оценки

Состав — выборка, не год · площадки не обследованы · 400 тыс. т — проектная

Заявления сторон

+15% цены — слова поставщика · 6 800 подписей не проверены · сбыт — намерение

Реестр достоверности: 14 сведений со статусом и способом проверки · 2

Шесть писем — шесть сторон: каждая получает ответ с конкретной датой



Жители
Встреча до 18.11, совет, обсуждение 20.01

Маслихат
Ответ до 18.11, график раскрытия

Финслужба
Прогноз 30.11, далее ежемесячно

Поставщик
Требования 02.12, без обязательств

Оператору — рабочая группа и аудит маршрутов; переработчику — образцы и меморандумы до 25.01 · 3

Система, а не завод: сделать правильную сортировку проще, чем неправильную

Житель
Удобный раздельный сбор у дома
4 фракции · QR на площадке · итоги района

Оператор вывоза
Маршруты и контроль качества
аудит маршрутов · весы на машинах · засорённость

Переработчик
Стабильные фракции
прогноз объёмов · стандарты · образцы

Акимат и жители
Управление и доверие
публичная панель · KPI · бюджет

↑ данные ↓ решения

ИС учёта материальных потоков (статья 1,5 млрд ₸)
Реестр контейнерных площадок · весовой учёт · маршруты · засорённость · сбыт фракций · освоение бюджета

QR-коды площадок · весы на мусоровозах · GPS маршрутов · лаборатория качества · открытые данные

↑ поток ↓

Контейнерная сеть
8,0 млрд ₸ · раздельный сбор


Транспорт и логистика
6,0 млрд ₸ · с оператором

Комплекс сортировки + компост
35,0 млрд ₸ · модульно

Площадка и сети
9,0 млрд ₸ · по итогам изысканий

Обратная связь по нормам снизила отходы на 7–12% (Ek & Söderberg, 2024) · модульная первая очередь вместо 400 тыс. т · 4

Рабочая база — B; A и B обследуем, C отпадает по срокам и цене

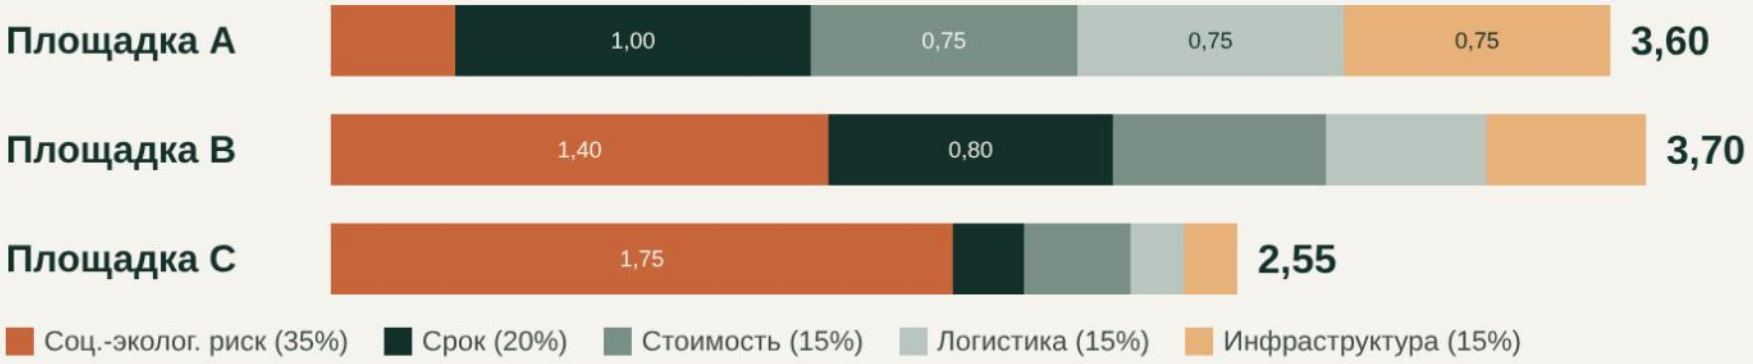

Фильтр да/нет до баллов


Санитарно-защитная зона и экологическая оценка. Для A (0,8 км до жилья) — под вопросом.

Чувствительность

Если вес социального риска < 30%, лидирует A. Поэтому решаем по изысканиям, а не по мнениям.

Площадка	До жилья	Подготовка	Срок	До центра	Сети / дороги
A	0,8 км	1 млрд ₸	3 мес.	7 км	есть / есть
B — база	5 км	3 млрд ₸	5 мес.	19 км	частично / модернизация
C	12 км	5 млрд ₸	8 мес.	28 км	нет / строительство


Проверить, договориться, зафиксировать: 4 этапа и 15 задач

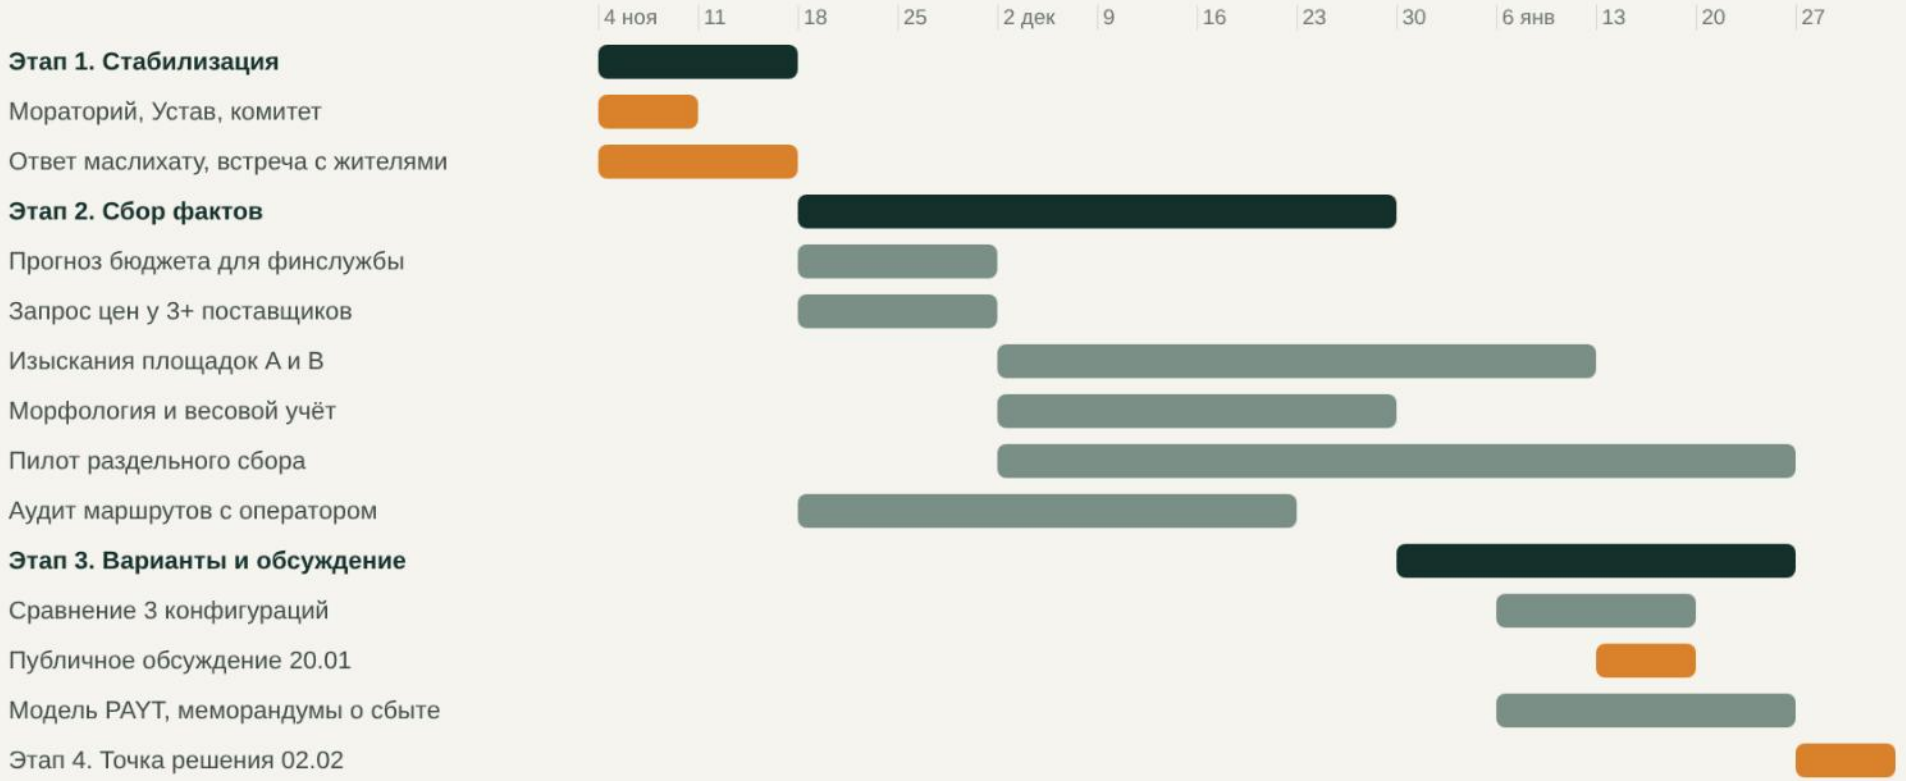


Две дорожки: проверка (пилот, сбыт, PAYT) и подготовка (изыскания, ТЗ, цены) сходятся 02.02 · 6

750 млн ₸ без необратимых контрактов; рост цены оборудования съедает резерв



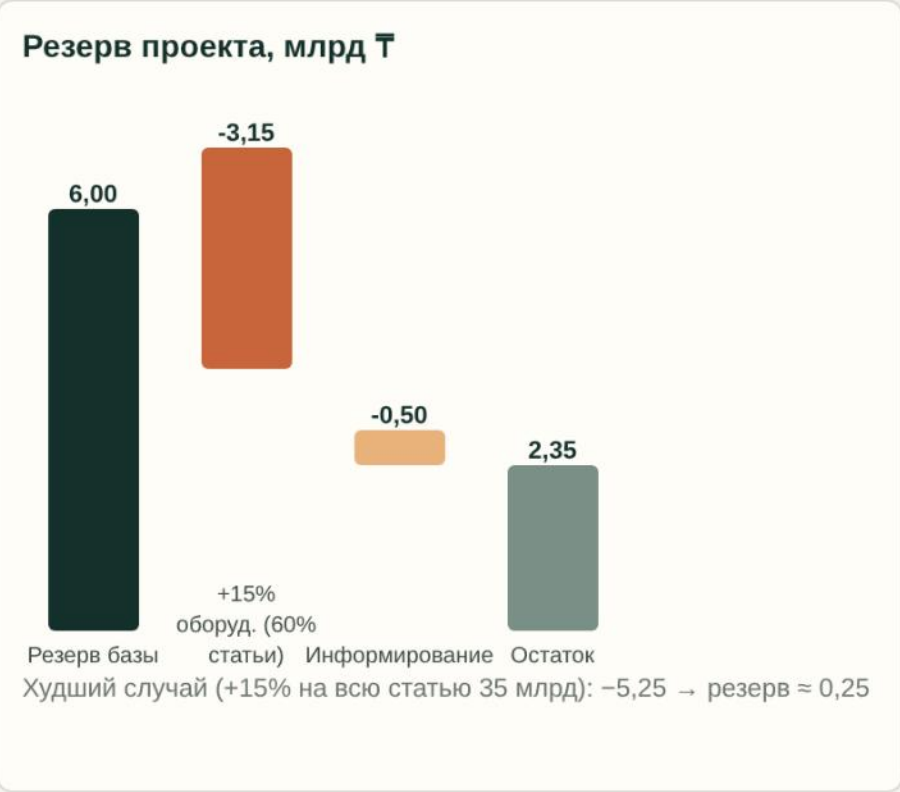

Ввод комплекса реалистично в октябре–декабре 2028; сбор и учёт — уже в 2027

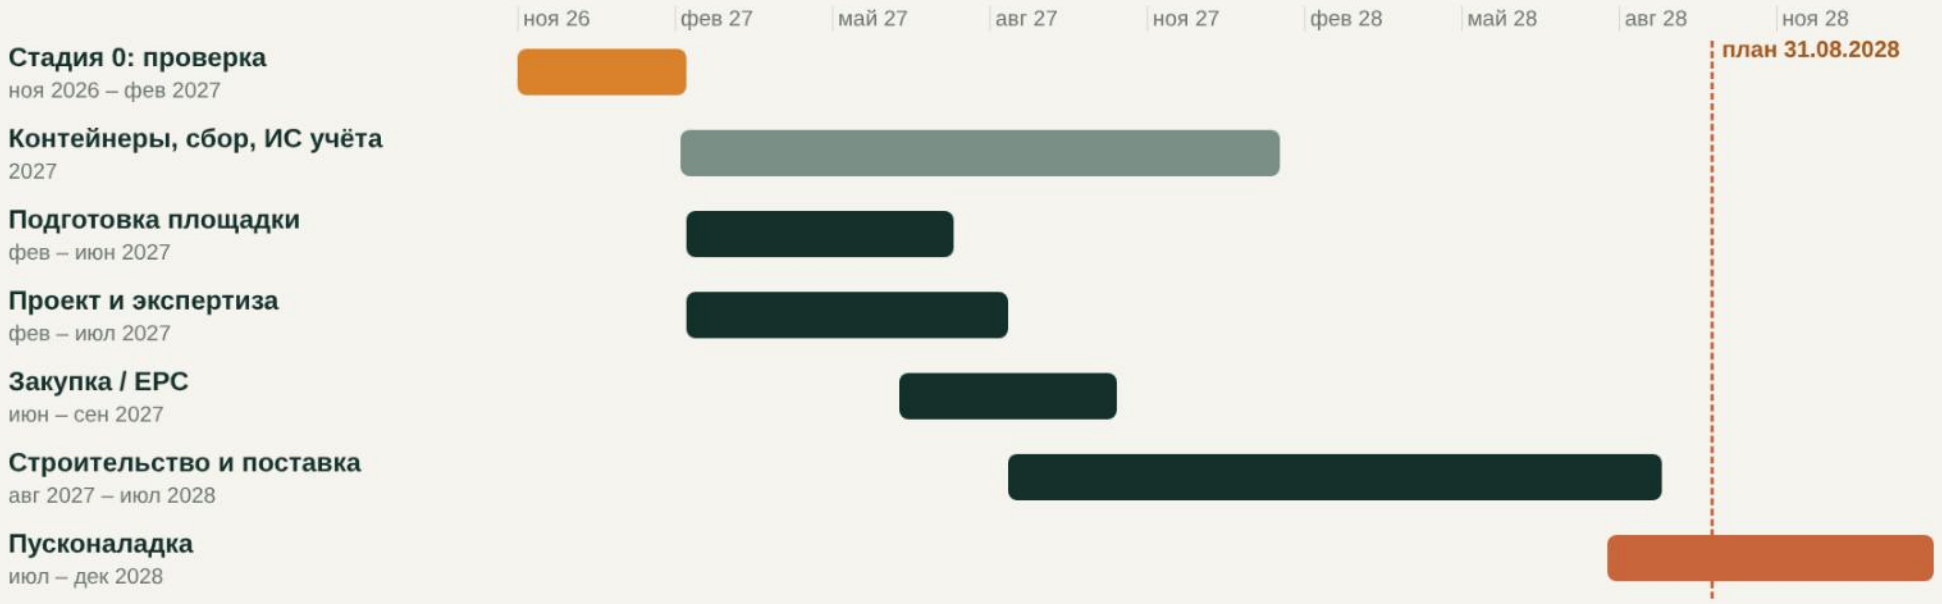

Спонсор
Аким: Устав, точка решения, изменение срока

Управляющий комитет
Изменения > 1% бюджета или 1 мес., резерв

Общественный совет
Материалы до решений по площадке

В красной зоне протест по площадке и цена оборудования: у каждого риска есть мера и триггер



R1 Протест при площадке А
R2 Рост цены оборудования
R3 Срыв срока
R4 Засорённость сбора
R5 Нет сбыта фракций
R6 Проблемы на В
R7 Затягивание ОВОС
R9 Исчерпание резерва
R10 Давление ускорить закупку
R13 Нарушение госзакупок

Тёмно-оранжевая зона ≥ 15 баллов, оранжевая 10–14.

Почему нам можно доверять: у решения есть дата и пять измеримых критериев

Пакет решения
Изыскания, цены, пилот, обсуждение, прогноз бюджета и срока

→

1. Площадка прошла санитарный и экологический фильтр
2. Цена подтверждена 2+ предложениями, резерв ≥ 5%
3. Меморандумы о сбыте ≥ 50% фракций
4. Схема вывоза согласована с оператором
5. Перепланированный срок принят заказчиком

→

Все 5 выполнены
GO: закупка оборудования / EPC

Не выполнены 3–5
GO с мерами в плане

Не выполнены 1 или 2
+60 дней проверки, крупных обязательств нет

ПРОСИМ ЗАКАЗЧИКА СЕГОДНЯ

Утвердить Устав стадии 0, мораторий на крупные обязательства, расходы до 750 млн ₸ и точку решения 2 февраля 2027 года
